

项目全流程操作手册

项目全流程操作手册

本手册供 PM 在项目工作中打印、随手翻阅，描述从项目启动到模块开发交接、项目级封板，以及程序员续接阶段的完整操作路径。

文档信息

项目	内容
文档名称	《项目全流程操作手册》
文档版本	V2.0
适用对象	产品经理、业务评审人；程序员可查阅续接章节
适用范围	新项目、新模块、需求变更、评审、开发交接和项目级封板
流程基线	P07 合并版 + 模块 PRD/SRS 二件套 + 评审 两阶段 + 5 项强制/1 项可选开发交接
最近更新日期	2026-07-15
当前状态	现行版

使用方式与权威边界

- 按任务查阅：先看下方“快速查阅索引”，直接翻到当前任务，不要求从头通读。
- 按阶段执行：阶段卡片回答何时进入、谁负责、需要什么、产出什么、何时停止。
- 按清单复核：项目推进时使用第八部分的一页速查清单逐项勾选。
- 权威边界：本手册负责导航和解释；实际执行约束以对应 SKILL、`.cursor/rules/` 和正式模板为准。发生冲突时，先按权威文件处理，再更新本手册。

快速查阅索引

当前任务	直接查阅
第一次启动新项目	第一部分：阶段 0 ~ 3
新增一个功能模块	第二部分：阶段 4 ~ 9

当前任务	直接查阅
老系统模块翻新	第四部分：横切 C → 第二部分阶段 4
客户提出需求变更	第四部分：横切 A
单独生成、补充或升版文档	第四部分：横切 B
严格审查 / 原型评审	第二部分：阶段 8A / 8B
向开发团队交接模块	第二部分：阶段 9
全部模块完成后封板 P07	第三部分：阶段 10
接口、构建和正式交付	第三部分：阶段 11 ~ 14
查待回写、会话和 Token 节省	第五部分
查命名、权威源和文档自检	第六部分
查归档目录	第七部分
打印后逐项勾选	第八部分

阅读约定：

- = 强制检查点（该步做完必须停下等你确认，AI 不会自动往下冲）。
- ⚠ = 需业务方确认 / 待确认事项。
- 💡 = 节省 AI 消耗的小贴士（散落各阶段，集中归纳见第五部分）。
- 「项目级一次性」= 整个项目只做一次；「模块级循环」= 每个功能模块各做一遍。

一、整体心智模型（先记住这 3 个角色）


SKILL	比喻	作用	频次
/项目总入口	分诊台	判断你该走哪条流程，只分流不产出	拿不准时随时喊
/项目与模块启动	总包工头	带你从需求一路做到原型（含翻新场景子分支）	项目级 1 次 + 每模块 1 次
/产品发现	开工前的勘探设计院	把模糊素材勘探成系统级总规划（地图/JTBD/旅程/功能/IA）	整个项目仅 1 次

一句话：迷路找总入口；要从需求做到原型找项目与模块启动；项目最开头那一次性的总体规划由产品发现完成。

1.1 全部 PM 可用 SKILL（共 6 个 PM 主责 + 3 个边界 SKILL）

主责方	SKILL	简述
PM	/项目与模块启动	带你做需求 → 原型；含翻新场景子分支
PM	/产品发现	项目级一次性，系统级 6 件套
PM	/评审	两阶段强制：阶段 1 严格审查（技术 QA）→ 阶段 2 原型评审（业务拍板）
PM	/需求变更	任意阶段的变更结构化处理
PM	/开发交接	原型评审通过后产出数据字典等开发包
PM	/文档生成与版本管理	单独生成 / 补充 / 升版任意文档
跨边界	/交付检查	广度一致性核验，评审前 / 交付前均可触发
程序员	/接口对齐	mock 字段 vs 真实接口对照
基础设施	/启动项目	启动 Vite 开发服务器

二、全流程总览图

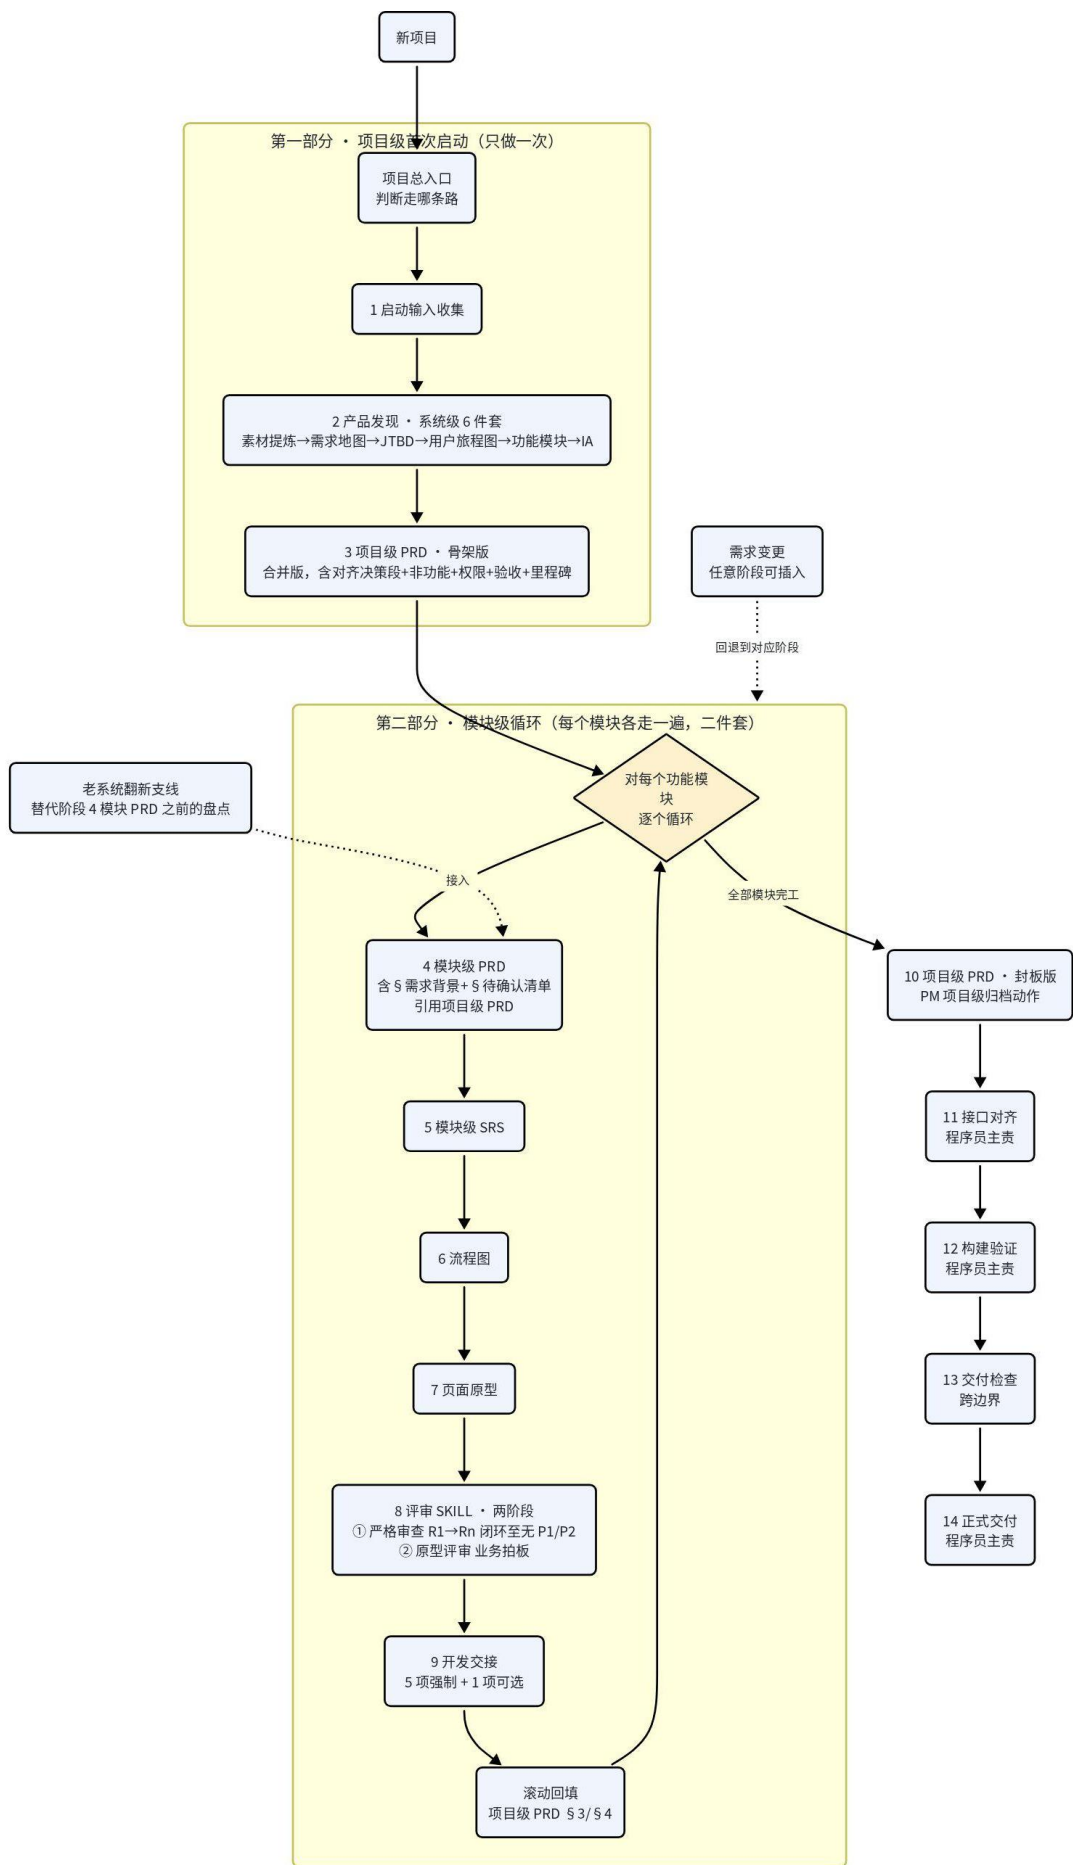

打印友好的文字版流程：

项目级开头（1 次）：总入口 → ①启动输入 → ②产品发现(6 件套) → ③项目级 PRD 骨架版（合并版）

模块级循环（每模块各一遍）：④模块 PRD（含需求背景）→ ⑤模块 SRS → ⑥流程图 → ⑦原型 → ⑧评审两阶段 → ⑨开发交接 → 回填项目级 PRD §3/§4

项目级封板（PM 归档动作，1 次）：⑩项目级 PRD 封板版

程序员续接：⑪接口对齐 → ⑫构建验证 → ⑬交付检查（跨边界）→ ⑭正式交付

三、PM 与程序员责任边界（重要）

- **模块级 PM 交付终点：**每个模块完成【⑨开发交接】即完成该模块的 PM 交付；交付前确认 `npm run dev` 可启动、关键原型流程可演示。
- **项目级 PM 归档动作：**全部模块完成后执行【⑩项目级 P07 封板】，补齐模块索引与依赖矩阵。该动作不反向阻断或撤销已完成的模块开发交接。
- **程序员主责：**【⑪接口对齐】及之后的生产构建、数据库、接口联调和部署；`npm run build` 不作为 PM 原型交付门槛。
- **跨边界：**【⑬交付检查】可在 PM 评审前作为一致性自检，也可在程序员正式交付前执行。

边界类型	PM 翻阅时的判断口径
PM 必须完成	项目级阶段 0 ~ 3；每个模块阶段 4 ~ 9；全部模块完成后的阶段 10
PM 按需完成	独立流程说明、测试用例、用户手册及其他按业务需要增加的交付物
程序员接手完成	阶段 11 接口对齐、阶段 12 构建验证、阶段 14 正式交付
跨边界共同检查	阶段 13 交付检查；接口字段和枚举语义需要 PM 时按需协助

第一部分 · 项目级首次启动（整个项目只做一次）

阶段 0：项目总入口（分流）

项	内容
何时进入	不确定下一步该做什么，或无法判断应触发哪个 SKILL 时
主责方	PM 发起，AI 负责分流
承载 SKILL	/项目总入口
输入	一句话诉求 + 现有材料情况
核心动作	判断任务类型，分流到正确的 SKILL；目标不清晰时先追问
输出	“该走哪条路线”的判断，不产出正式文档
归档	无
检查点	🛑 PM 确认分流方向后再进入对应流程
下一步	全新项目进入阶段 1；其他任务按分流结果跳转

阶段 1：启动输入收集

项	内容
何时进入	项目总入口确认本次为全新项目后
主责方	PM
承载 SKILL	/项目与模块启动（项目级）
输入	口头描述、Word 草稿、调研对话、会议记录、领导讲话、产品定位等原始材料
核心动作	收集项目背景、目标、角色、范围和已有材料；确认本轮目标停止节点
输出	整理后的启动输入，作为产品发现的直接输入
归档	无独立文档；原始材料按需放入 docs/user-requirements/
检查点	🛑 PM 确认启动输入完整后停止
下一步	阶段 2 产品发现

💡 节省消耗：如果材料超过 50 页 / 10 万字，先在文件系统里整理好分类（按“调研访谈 / 领导讲话 / 现有原型截图”分目录），再让 AI 按需读取，避免一次性 dump 全部入对话。

阶段 2：产品发现（系统级 6 件套 · 项目级一次性）

这是把“模糊、分散、大量”的原始素材，收敛成可落地系统级结构的核心阶段。由 /产品发现 SKILL 承载，整个项目只做一次，之后每个模块都引用它的成果，不重做。

项	内容
何时进入	阶段 1 启动输入已确认后
主责方	PM
承载 SKILL	/产品发现
输入	已确认的启动输入和原始需求材料
核心动作	先确认重/中/轻档，再按档位完成素材提炼、需求结构、功能模块和信息架构
输出	P01 ~ P06 中当前档位要求的系统级产品发现成果
归档	docs/discovery/
检查点	🛑 每个子阶段完成后停止确认
下一步	阶段 3 项目级 P07 骨架版

档位先选（强制，省钱关键）：进入素材提炼前，AI 会先和你完成档位确认。

档位	适用场景	做哪些子阶段	大致 Token 消耗
重档	复杂面向用户 / 多角色 / 多触点 / 流程长	6 子阶段全做（P01~P06 全产出）	高
中档（默认推荐）	中等复杂度的内部系统 / 单 B 端 / 流程清晰	P01 素材提炼 + P05 功能模块 + P06 IA 必做；P02 需求地图并入 P05、P03 JTBD 简化为对照表（仍产出）、P04 用户旅程图跳过	中
轻档	工具型 / 极简内部页	3 子阶段（仅 P01 素材提炼 + P05 功能模块 + P06 IA；P02/P03/P04 全跳过）	低

💡 节省消耗：默认选中档，等模块原型评审时如发现痛点没识别再补做 JTBD/旅程。**禁止默认选重档**——绝大多数中后台系统中档够用，重档会多消耗 30-50% token。

全链路可追溯：每层条目带来源 ID，形成 M（素材）→ RM（需求地图）→ JTBD → UJ（旅程触点）→ F（功能）→ IA 的链路。

子阶段	做什么	输入	输出产物（系统级各一份）
0 素材提炼与价值取舍	按价值评分裁决去留、噪声留痕不删（重档 5 维评分 + ☒ 纳入/ ☒ 降级/ ☒ 拆解/ ☒ 丢弃；中/轻档 3 档评分 ☒ / ☒ / ☒ ，无 ☒ 拆解）	阶段 1 的全部原始素材	《P01-{系统名}素材提炼与价值取舍》

子阶段	做什么	输入	输出产物（系统级各一份）
1 需求地图	把纳入的需求按多级主题铺成全景	素材提炼产物	《P02-{系统名}需求地图》（仅重档独立产出；中档并入 P05、轻档跳过）
2 JTBD（用户任务）	收敛出用户核心任务与动机	需求地图	《P03-{系统名}JTBD（用户任务）分析》（中档简化为角色-任务对照表仍产出；轻档跳过）
3 用户旅程图	画用户达成目标的阶段/触点/痛点，痛点驱动功能发现	JTBD + 角色	《P04-{系统名}用户旅程图》（中/轻档跳过）
4 功能模块清单	聚类出多级功能模块（= 后续模块拆分依据）	旅程 + JTBD	《P05-{系统名}功能模块清单》
5 信息架构 IA	组织成系统导航/页面层级，作为原型输入	功能模块清单	《P06-{系统名}信息架构（IA）》

阶段 3：项目级 PRD · 骨架版（合并版 · 系统级 · 一次性定锚）

项	内容
何时进入	产品发现成果达到当前档位完成标准后
主责方	PM
承载 SKILL	/项目与模块启动（项目级）
输入	产品发现成果 + PM 口头确认
核心动作	先填 §9 ~ §12 对齐决策段，再补 §1、§2、§5 ~ §8 项目级骨架；§3、§4 留壳待回填
输出	《P07-{系统名}产品需求文档（PRD）》骨架版，内文标题含 “ · 项目级 ”
归档	docs/formal-requirements/P07-{系统名}产品需求文档（PRD）.md
检查点	🛑 §9 决策逐项确认，且 §1、§2、§5 ~ §8 各成节后停止
下一步	进入第二部分，按模块循环执行阶段 4 ~ 9

关键约束：不得展开模块业务功能；不得复制产品发现已有内容，只做具体章节引用。

💡 **节省消耗：**本阶段最费时、也最占上下文的是 §9 已确认决策表（常见为三十至五十条）。建议拆成两次会话完成：第一次只写「对齐决策段」（§9 至 §12），并与你逐条对齐；第二次再补 §1、§2 以及 §5 至 §8 的项目级锚点章节。这样避免同一会话里既要读完产品发现六件套，又要带着整份决策表反复修改，双重上下文叠加，token 消耗会明显偏高。

至此项目级首次启动完成。下面对每个功能模块逐个循环。

第二部分 · 模块级循环（每个功能模块各走一遍 · 二件套）

模块从产品发现的《功能模块清单》拆出。每个模块独立走下面阶段 4 ~ 阶段 9。模块级不重做产品发现，直接引用项目级成果（含项目级 PRD）。

模块级二件套（强制）：新模块默认只产出 PRD + SRS 两份文档。

阶段 4：模块级 PRD（二件套首件）

项	内容
何时进入	P07 已定锚，并从 P05 / P07 §11 选定当前模块后
主责方	PM
承载 SKILL	/项目与模块启动（或 /文档生成与版本管理）
输入	项目级 P07 §9 ~ §12 + 产品发现中当前模块的相关条目
核心动作	完成需求背景、范围、角色、业务流程、业务规则、业务级验收和待确认清单
输出	《M{n}-02-{模块名}模块产品需求文档（PRD）》，内文标题含“ · 模块级”
归档	docs/formal-requirements/
检查点	🔴 PM 确认模块业务范围、角色、规则和待确认清单
下一步	阶段 5 模块级 SRS

关键约束：PRD 写业务视角，不展开字段类型和校验；引用 P07 项目级非功能、权限和术语，不重复定义。

⚠ 老系统翻新支线：若该模块在老系统已有实现，本阶段之前先走 §横切 C 老系统翻新支线，产出《M{n}-01-{模块名}模块老系统盘点与翻新决策》作为本 PRD 的输入；PM 确认翻新决策后再回到本阶段。

💡 节省消耗：模块 PRD 章节固定，复用模板 templates/requirements/module-prd-template.md 让 AI 按模板填充比开放式生成省 20-30% token。

阶段 5：模块级 SRS（二件套次件）

项	内容
何时进入	模块 PRD 的业务范围和规则已确认后
主责方	PM
承载 SKILL	/项目与模块启动（或 /文档生成与版本管理）

输入	已确认的模块级 PRD
核心动作	定义字段、控件、校验、权限、接口数据、状态规则、异常处理和技术 AC; §5 每功能点采用五段式
输出	《M{n}-03-{模块名}模块软件需求规格说明书 (SRS) 》
归档	docs/formal-requirements/
检查点	🔴 锁定字段名、状态名、规则和技术 AC, 后续原型不得擅自改变
下一步	复杂流程进入阶段 6; 简单流程可在 SRS 内表达后直接进入阶段 7

阶段 6: 流程图

项	内容
何时进入	SRS 已确认, 且流程包含较多节点或异常分支时
主责方	PM
承载 SKILL	/项目与模块启动 (或 /文档生成与版本管理)
输入	模块 PRD、SRS
核心动作	用 Mermaid 和文字说明主流程、异常流程、角色、状态与边界
输出	《M{n}-04-{模块名}模块流程说明》; 简单流程可直接写入 SRS §5.x.3
归档	docs/flow/ (按需创建)
检查点	🔴 流程节点、判断条件、异常分支与 PRD/SRS 一致
下一步	阶段 7 页面原型

💡 可省略场景: 模块流程简单 (< 5 个节点 + 无异常分支) 时, 可直接在 SRS §5.x.3 处理逻辑里画 mermaid, 不单独成文件。

阶段 7: 页面原型

项	内容
何时进入	SRS 字段、状态和交互规则已锁定后
主责方	PM
承载 SKILL	/项目与模块启动
输入	SRS 功能规格、字段、状态机; IA 页面结构; 流程说明 (如有)
核心动作	搭建可评审的 Vue 原型, 覆盖正常、空、异常和禁用状态

输出	页面组件、Mock、路由/菜单等实际依赖 + 页面清单
归档	src/views/{模块目录}/、src/mock/ 及实际依赖位置
检查点	🔴 原型可演示，且字段、状态、交互与 SRS 一致
下一步	阶段 8A 严格审查

💡 小改时的回写策略：原型搭好后你会频繁微调（改文案 / 调颜色 / 合并字段等），这些小改 AI 默认不立刻同步到 PRD/SRS，而是记入 docs/_待回写清单.md，等阶段 8 评审窗口或后续 /交付检查 / 需求变更 等窗口统一回写。详见第五部分 §5.1。

阶段 8：评审（两阶段强制顺序）

/评审 SKILL 强制先做阶段 1（技术 QA），闭环至无 P1/P2 后才能做阶段 2（业务拍板），不可并行 / 跳过 / 换序。

8A：阶段 1 · 严格审查（技术 QA · 多轮）

项	内容
何时进入	原型达到可评审状态后
主责方	AI 技术 QA, PM 决定修复方向
承载 SKILL	/评审 阶段 1（/严格审查 或 /评审 默认入口）
输入	PRD、SRS、原型、Mock、规则基准和 docs/_待回写清单.md
核心动作	先批量回写清单，再扫描 PRD→SRS 业务覆盖、SRS↔ Vue 技术规格和实现质量
输出	《{模块名}严格审查报告-R{轮次}-{YYYYMMDD}》
归档	docs/review/
检查点	🔴 多轮 R1→Rn 闭环至无 P1/P2；问题状态回写为 ✓、 或 ✕
下一步	无 P1/P2 后进入阶段 8B；否则按 PM 决策修复并复核

8B：阶段 2 · 原型评审（业务拍板）

项	内容
何时进入	阶段 8A 已闭环至无 P1/P2 后
主责方	PM / 业务方
承载 SKILL	/评审 阶段 2（/原型评审）
输入	原型、PRD、SRS、流程说明（如有）和最近一轮严格审查报告

核心动作	从业务视角判断覆盖情况，记录通过项、需修改项、待确认项和阶段决策
输出	《{模块名}原型评审结论》或项目级阶段决策报告
归档	docs/review/
检查点	🔴 PM / 业务方填写 §5.1 决策表，AI 再同步 §5.2、§6、§8
下一步	通过且决定继续时进入阶段 9；否则按决策修订或停止

💡 节省消耗：阶段 1 多轮迭代时，**强烈建议每一轮开新会话**（详见第五部分 §5.2）。同会话里跑完 R1→R3 三轮会让 AI 反复读取整份历史，token 消耗呈平方级增长；每轮新会话只需读“当前轮 + 上一轮报告”，单轮成本下降 60-70%。

阶段 9：开发交接（模块级 PM 交付终点）

项	内容
何时进入	阶段 8B 原型评审通过，且 PM / 业务方决定继续交接后
主责方	PM
承载 SKILL	/开发交接
输入	模块 PRD、SRS §5、原型代码包、原型评审结论；流程说明（如有）
核心动作	生成数据字典，校验并组织 5 项强制交付物；存在流程图时作为 1 项可选内容纳入
输出	5 项强制：PRD、SRS、数据字典、原型代码包、原型评审结论；1 项可选：流程说明
归档	数据字典进入 docs/data/；其余交付物保留原归档位置
检查点	🔴 完成后选择：进入程序员接口对齐 / 当前模块收尾 / 生成按需增项
下一步	回填 P07 §3/§4；继续下一模块，或全部模块完成后进入阶段 10

模块级 PM 交付完成标准：原型评审通过；npm run dev 可启动；关键页面可演示；5 项强制齐全；代码包列明实际依赖。无需先执行 npm run build。

至此该模块的 PM 原型交付完成。生产构建、接口联调、数据库和部署由程序员接手，不反向阻断 PM 交付结论。返回循环起点处理下一个模块；全部模块完工后进入阶段 10 项目级 PRD 封板版。

第三部分 · 项目级封板与程序员续接

阶段 10：项目级 PRD · 封板版（系统级 · 项目收尾前一次性封板）

全部模块循环完工后，对项目级 PRD 做最后一次复核与封板，作为正式交付的需求权威源。

项	内容
何时进入	全部模块均完成阶段 9，并已滚动回填 P07 §3/§4 后
主责方	PM
承载 SKILL	/项目与模块启动（项目级）
输入	阶段 3 骨架版、各模块回填记录和全部模块 PRD
核心动作	补全 §3 模块索引和 §4 依赖矩阵；复核 §1、§5 ~ §9；按版本规则封板
输出	《P07- <code>{系统名}</code> 产品需求文档（PRD）》封板版，覆盖原骨架版同一文件
归档	docs/formal-requirements/P07- <code>{系统名}</code> 产品需求文档（PRD）.md
检查点	🛑 §3 与实际模块 PRD 一一对应，§4 无遗漏且无依赖时显式写“无”
下一步	完成 PM 项目级归档；程序员按需进入阶段 11

阶段 10 不反向阻断或撤销已完成的模块开发交接；它解决的是项目级 P07 最终完整性。

程序员续接说明：以下阶段 11 ~ 14 不属于 PM 模块原型交付门槛。PM 仅在接口字段确认和交付检查中按需协助。

阶段 11：接口对齐（程序员主责，PM 协助）

项	内容
何时进入	模块开发交接完成，且真实后端契约已具备或联调准备开始时
主责方	程序员，PM 协助确认业务字段和枚举语义
承载 SKILL	/接口对齐
输入	Mock、SRS §5/§6、数据字典和真实接口契约
核心动作	对照字段、接口和枚举，区分纯后端、共有和纯前端字段，记录差异与待确认项
输出	《 <code>{模块名}</code> 接口对齐报告》

归档	docs/api-alignment/（按需创建）
检查点	🔴 字段归属、命名、枚举和待确认事项形成明确结论
下一步	阶段 12 构建验证

阶段 12：构建验证（程序员主责）

本阶段发生在 PM 原型交付完成之后。构建失败会阻断程序员后续正式交付，但不撤销已经完成的 PM 原型交付。

项	内容
何时进入	接口对齐已闭环，准备验证可构建和关键路径时
主责方	程序员
承载 SKILL	/接口对齐 的“构建验证移交清单”，不单独新增 SKILL
输入	接口对齐报告、原型/前端代码和真实后端（如已具备）
核心动作	执行 <code>npm run build</code> 、 <code>npm run preview</code> 和关键路径冒烟
输出	Node/npm 版本、构建退出码、预览地址、冒烟结果、失败项和处理人
归档	按开发团队工程记录归档，不新增 PM 正式文档
检查点	🔴 构建退出码为 0 且关键冒烟通过；失败则回到对应代码或接口问题
下一步	阶段 13 交付检查

关键冒烟：系统首页、目标模块入口、列表查询、新增/编辑、状态变更和 404 兜底。未接真实后端时只可标记“原型构建验证通过”。

阶段 13：交付检查（跨边界）

项	内容
何时进入	PM 评审前需要横向自检，或程序员正式交付前需要全量核验时
主责方	PM / 程序员按触发场景共同负责
承载 SKILL	/交付检查
输入	P07、模块 PRD/SRS、流程、原型、测试、评审报告、说明书和 docs/_待回写清单.md
核心动作	横向核验术语、角色、范围、流程、原型、测试、说明书和阶段决策的一致性

项	内容
输出	默认对话结论；明确要求归档时生成《{模块名}交付检查报告-{YYYYMMDD}》
归档	要求归档时进入 docs/review/
检查点	🔴 阻断项已修复或形成明确决策，待确认项不得伪装成通过
下一步	PM 自检场景返回对应评审阶段；程序员交付场景进入阶段 14

与严格审查的分工：阶段 8A 管单模块深度，阶段 13 管多交付物广度。

阶段 14：正式交付

项	内容
何时进入	程序员侧交付检查无阻断项后
主责方	程序员 / 项目交付负责人
承载 SKILL	无独立 SKILL，依据交付检查结论和组织交付流程执行
输入	已通过的交付检查结论、可交付系统和完整交付材料
核心动作	按组织流程完成正式交付，或明确进入下一代
输出	正式交付结果或下一代范围
归档	按项目交付制度归档
检查点	🔴 交付范围、版本、遗留风险和责任人均已明确
下一步	项目关闭或进入下一代

第四部分 · 横切流程（任意阶段可能触发）

横切 A：需求变更

项	内容
何时进入	客户在任意阶段提出新增、修改、删除或范围变化时
主责方	PM
承载 SKILL	/需求变更
输入	客户原始诉求、会议纪要、截图 + 当前 PRD/SRS/原型
核心动作	清洗变更输入，生成 CR 编号，分析影响范围并推荐回退阶段；PM 确认前不改正式交付物
输出	追加式《{模块名}变更记录》
归档	docs/changes/
检查点	🔴 状态按提交→评估→批准/驳回→执行→完成推进，每次等待 PM 决策
下一步	按回退阶段重新触发 PRD、SRS 或原型环节，完成后回到阶段 8A

横切 B：文档生成与版本管理

项	内容
何时进入	需要单独生成、补充或升版 PRD、SRS、流程、测试用例、说明书等文档时
主责方	PM
承载 SKILL	/文档生成与版本管理
输入	当前权威文档、用户补充信息、变更依据和版本决策
核心动作	判断新生成/补充/升版类型，选择模板，更新权威源并同步跨文档版本引用
输出	对应类型的新文档或升版后的原文件
归档	按第七部分归档路径保存
检查点	🔴 PM 确认升版范围、引用同步范围和不升版理由
下一步	返回触发本横切流程的原阶段；需要评审时进入阶段 8A

横切 C：老系统翻新支线（替代模块阶段 4 之前的盘点）

项	内容
何时进入	当前模块在老系统已有实现，且尚未开始阶段 4 模块 PRD 时
主责方	PM
承载 SKILL	/项目与模块启动 §2.3-翻新
输入	老系统访问结果或截图、现有功能说明、P07 决策与术语
核心动作	完成老系统功能、翻新决策、术语映射和待业务决策 4 张表
输出	《M{n}-01-{模块名}模块老系统盘点与翻新决策》，这是唯一仍产出 M{n}-01 的场景
归档	docs/formal-requirements/
检查点	🛑 PM 逐项确认 4 张表决策
下一步	回到阶段 4，将翻新结论写入模块 PRD 需求背景和范围

触发词：“翻新” “旧系统改造” “老系统迁移” “基于老系统重做”，或用户提供老系统访问地址 / 截图。

盘点方式：A. AI 自动浏览老系统（需提供凭证）；B. 用户提供截图；C. A+B 混合。


💡 节省消耗：方式 A（AI 自动浏览）虽然省你时间，但消耗较高（每页约 5K-10K token）；如果你能轻松截图，方式 B 更省。混合方式 C 用 AI 浏览作为主输入、截图补充看不清的位置，平衡省钱和质量。

第五部分 · 节省 AI Token 消耗的实战要诀（强烈推荐细读）

何时查本部分：原型频繁小改、会话越来越长、准备切换模块，或不知道该触发哪个 SKILL 时。

5.1 待回写清单（docs/_待回写清单.md）的工作机制

什么是待回写清单：原型阶段你会频繁做“小改”（改文案、调颜色、合并字段）；如果每改一次就让 AI 同步 PRD/SRS，每次都要读写整份长文档，成本极高。本项目用「先记账、不立刻回写」的折中：

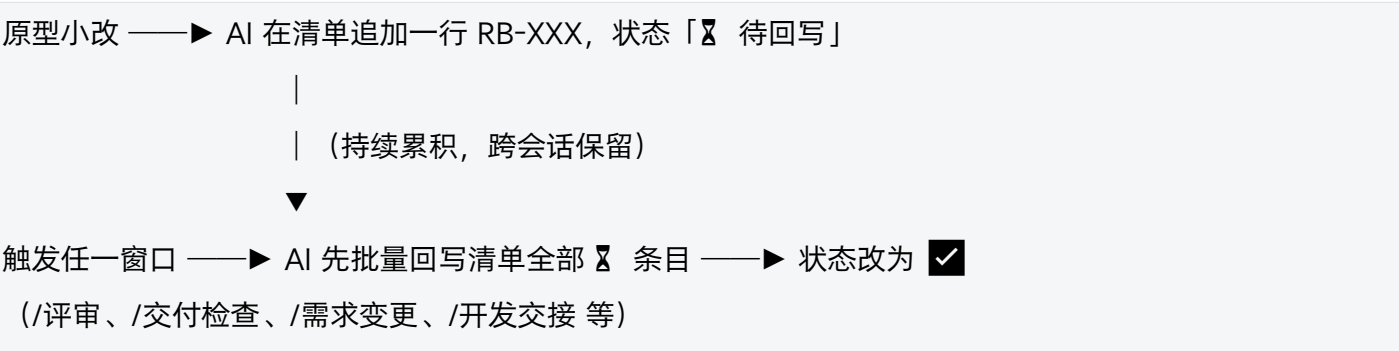

回写窗口触发条件（命中任一即统一批量回写）：

#	触发条件
1	用户调用 /评审 SKILL（含阶段 1 严格审查 / 阶段 2 原型评审）
2	用户调用 /交付检查 SKILL
3	用户调用 /文档生成与版本管理 SKILL
4	用户调用 /需求变更 SKILL
5	用户调用 /开发交接 SKILL
6	用户调用 /接口对齐 SKILL
7	模块阶段切换时（如 M4 收尾切到 M5 之前）
8	业务方 / 外部评审前（用户明确说“给业务方看 / 打印 / 正式交付”等）
9	项目阶段性里程碑或归档时
10	用户显式说“回写文档 / 同步到文档 / 更新文档”

你需要做的事（极少）：

- 多数时间不用管这份文件，AI 自动维护
- 看到 AI 回复末尾出现「待回写提示」，心里有数本轮改动已挂账
- 看到 AI 提示「🗒️ 条目数已 ≥ 10」时，在合适时机触发任一窗口让 AI 批量回写
- 你想立刻同步某条改动时，对 AI 说「现在把 RB-003 回写到 SRS」即可

💡 **节省效果：**原型阶段不立刻回写 PRD/SRS，能节省 30-50% token；触发回写窗口时批量回写比“每改一次回写一次”省 60-80%。

5.2 会话切换习惯（什么时候要开新会话）

核心痛点：Cursor 单次会话的上下文 token 随轮次累积，每次 AI 回复都重新读取整条历史，成本与轮次成平方级增长。

强制触发新会话的场景（命中任一即新开会话）：

#	触发条件
1	用户调用 /评审 SKILL（含任一阶段）
2	用户调用 /交付检查 SKILL
3	用户调用 /开发交接 SKILL
4	用户调用 /需求变更 SKILL
5	模块阶段切换（如 M4 收尾切到 M5）
6	单次会话累计已修改 ≥ 8 个文件
7	单次会话历经 ≥ 30 轮对话且话题已切换
8	大型规则 / SKILL 体系改造完成后

新会话开场标准动作（AI 会自动做，你不用操心）：

- 1. 先读 docs/_待回写清单.md（即使为空也读）
- 2. 读你请求中提到的目标文档
- 3. 涉及术语 / 决策 / 模块编号时，读 P07 PRD §9 ~ §11
- 4. 读相关 SKILL
- 5. 涉及代码时读相关 .vue / mock

💡 节省效果：在 30 轮会话开新会话，单轮成本下降约 70%（不再重读长历史）；做评审 / 重要节点开新会话，AI 注意力更聚焦在“当前任务”而非“已废弃的早期讨论”。

详细规则见 `.cursor/rules/session-management.mdc`（已设 `alwaysApply: true`，AI 自动遵守）。

5.3 其他上下文管理小技巧

技巧	节省效果	操作
用 @文件名 显式引用代替“看一下那个文件”	中	AI 不用全仓搜索，直接读你指定文件
让 AI 用 Grep 找具体行，不要让它 Read 整份长文件	高	直接说“用 Grep 找 XXX 在 PRD 里出现的位置”
改动一类问题时，先列出全部要改的位置，再一次性批量改	中	避免 AI 反复读同一份文件

技巧	节省效果	操作
复杂任务先要计划、确认后再执行（用户规则已强制）	中	避免改完发现方向不对推倒重做
长文档（> 500 行）改动时，让 AI 用 StrReplace 精准定位，禁用全文重写	高	StrReplace 只读改动周围几行，Write 整文件每次都读全部

5.4 SKILL 选择技巧（不要乱触发）

误用	推荐	原因
闲聊式问“下一步该做什么”	触发 /项目总入口 SKILL	总入口只做分流，不进入任何重 SKILL 上下文
同时触发 /严格审查 又触发 /原型评审	只触发 /评审（AI 内部自动分阶段）	评审 SKILL 已合并两阶段，分别触发会重复读取
单个文件小改也触发 /文档生成与版本管理	直接对话说“补一下 SRS §5.3 字段表”	重 SKILL 加载本身有固定开销
每改一行代码就让 AI 写注释 / 文档	一批改动后统一让 AI 加注释 / 同步文档	批量比单次省

第六部分 · 其他需要注意的（坑点 & 约定）

何时查本部分：准备新建或升版文档、发现术语/字段不一致、需要回写原型变更，或不确定文件命名与归档规则时。

6.1 文件编辑安全（编码坑，硬性约束）

项目所有 md / vue / json 文件为 UTF-8 无 BOM 编码；PowerShell 默认用 GBK 读写会把多字节汉字末字节截成？，导致：

- JS 字符串未闭合 → Babel 解析报错
- HTML 属性未闭合 → Vue 模板编译报错
- 注释错乱 → 后续元素全部解析失败

铁律：让 AI 编辑文件必须用专用工具（StrReplace / Write / Read / Grep / Glob），禁止用 Shell +Get-Content/Set-Content/cat/echo。AI 自身已有规则 .cursor/rules/file-edit-safety.mdc 强制遵守，你不需要做任何操作，但如果发现文件出现？或 ĩ¿½ 等乱码，立刻让 AI 停止后续写入并用 Read 工具定位损坏范围。

6.2 文档命名约定（P / M 双层前缀）

前缀	适用	例
P{nn}-	项目级（系统级一份，全项目唯一）	P01-...素材提炼.md / P07-...PRD.md
M{n}-{nn}-	模块级（每模块一组）	M4-02-活动管理模块 PRD.md
无前缀	报告类（评审 / 审查 / 变更 / 对齐 / 数据字典等）	用户管理严格审查报告-R1-20260101.md

项目级编号已固定（不得改动）：

- P01-P06：产品发现 6 件套
- P07：项目级 PRD
- P08：已废弃（原 P08 项目级 PRD 已合并入 P07）

模块级编号：

- M{n}-01：已废弃（原结构化需求底稿，新模块走二件套不再产出）；例外：老系统翻新模块仍产出 M{n}-01-{模块名}模块老系统盘点与翻新决策.md
- M{n}-02：模块级 PRD（二件套首件）
- M{n}-03：模块级 SRS（二件套次件）
- M{n}-04：流程说明

详见 .cursor/rules/doc-format.mdc § “正式交付文档命名”。

6.3 PRD / SRS 分工边界（单一权威源原则）

内容类型	唯一权威源	另一份文档处理
业务背景 / 用户痛点 / 项目目标	PRD	SRS 不重复，须引用
字段清单 / 控件类型 / 校验规则	SRS §5.x.2	PRD 不写字段表
AC 验收标准	SRS §10	PRD §12 只写业务级高层 AC
状态机 / 业务规则细节	SRS §5.x.4	PRD §9.x.3 仅简述
非功能需求技术指标	项目级 PRD §6	模块级 PRD / SRS 不重复

重叠率红线：PRD/SRS 同模块章节重叠率 ≤ 15%，超出视为违规（评审阶段 1 严格审查会标记为冗余问题）。

6.3.1 发生变化时先改哪份文档

变化内容	唯一权威源	后续同步对象
项目范围、统一术语、模块编号、项目级决策	项目级 P07 §9 ~ §12	受影响模块 PRD、SRS 和原型

模块业务背景、业务范围、角色场景、业务流程	模块 PRD	若影响技术实现，再更新 SRS 和原型
字段、控件、校验、状态规则、精确提示文案、技术 AC	模块 SRS	Vue 原型、Mock、测试用例；PRD 只在业务语义变化时更新
不改变业务语义的界面细化	Vue 原型	先登记 docs/_待回写清单.md；到回写窗口再统一判断是否更新文档
接口与数据要求	模块 SRS §6	数据字典、接口对齐报告、真实接口接入代码
前端字段命名与枚举	数据字典	Mock、接口对齐报告、真实接口接入代码
评审决策、接受或推迟事项	对应严格审查报告 / 原型 评审结论	按决策影响回写 PRD、SRS、原型或开发交接范围

6.3.2 跨文档更新与升版顺序

1. 先判断变化属于哪一个唯一权威源，禁止同时在多份文档中独立定义。
2. 先修改权威源，再按上表同步引用方；跨文档引用必须带具体章节号。
3. 原型小改先进入 docs/_待回写清单.md，只在评审、交付或用户明确要求时批量回写。
4. 有功能、范围、字段、状态或验收标准实质变化时，触发 文档生成与版本管理 判断相关文档是否升版。
5. 仅修正错别字或格式时不升版；版本记录与文档信息中的版本号必须一致。

版本号幅度、版本记录 3 ~ 5 条上限及合并规则，以 .cursor/rules/doc-format.mdc § “SRS 文档统一规范” 为准。

6.3.3 文档交付前自检

- ☐ 文件名、文档内名称和归档目录符合 doc-format.mdc。
- ☐ 文档信息中的版本号与最新版本记录一致。
- ☐ 项目级内容、业务语义和技术规格分别保存在正确权威源，没有重复定义。
- ☐ 所有跨文档引用都含具体章节号，目标文件和章节真实存在。
- ☐ P07 §10 术语、§11 模块编号与模块 PRD、SRS、原型一致。
- ☐ 到达评审或交付窗口时，docs/_待回写清单.md 中相关条目已处理。
- ☐ 评审报告中的问题和决策均为 、 或  终态，不保留“待处理”等中间态。
- ☐ docs/samples/ 仅作为学习样例，没有混入真实项目正式交付包。

6.4 签字门槛已废止（Cursor 协作专用约定）

文档里仍保留的“签字栏 / 已签字 / 签字状态”措辞，只用于真实世界打印 / 政策合规流程，不是 Cursor

协作中的推进门槛。

- AI 不会追问 “业务方是否签字”
- 你在对话中口头确认即视为有效推进依据
- 仅当你主动问 “如何打印交付 / 如何走线下签字” 时，AI 才展开说明

详见 `.cursor/rules/project-collaboration.mdc` § “签字门槛执行约定”。

6.5 关键规则文件位置（出问题时按图索骥）

你想知道	看哪个规则文件
文件编辑安全	<code>.cursor/rules/file-edit-safety.mdc</code>
文档命名 / 状态符号 / PRD-SRS 分工	<code>.cursor/rules/doc-format.mdc</code>
协作规范 / 签字门槛 / 原型回写策略	<code>.cursor/rules/project-collaboration.mdc</code>
Vue UI 实现规范（控件 / Toast / 表单 / 间距）	<code>.cursor/rules/vue-ui-implementation.mdc</code>
严格审查员人设 / 三问自检	<code>.cursor/rules/strict-reviewer.mdc</code>
用户决策后的核查流程	<code>.cursor/rules/answer-faithfulness.mdc</code>
会话切换习惯	<code>.cursor/rules/session-management.mdc</code>

6.6 常见坑 / 操作禁忌

不要做	为什么	该怎么做
不要让 AI “一次把整个项目原型都做出来”	上下文爆炸 + 质量下降	按模块循环，每模块阶段 4~9 走一遍
不要让 AI 同时改 PRD + SRS + 原型 + Mock	4 份文档同步出错概率极高	按 “先 PRD → 后 SRS → 再原型” 的顺序逐份改
不要让 AI 跳过 评审 直接进 开发交接	开发交接 SKILL 会拒绝执行（强制前置）	老老实实走评审两阶段
不要在同一会话跑完 R1~R5 五轮严格审查	token 平方级增长	每轮新会话
不要绕过 严格审查 让 AI 自动修复 P1 问题	AI 不应自行启动修复	等审查报告出来后你说 “修 P1-001 到 P1-003” 再开始
不要让 AI 自动给 “待业务确认 / 待回答” 标 	这是中间态，不能作为最终状态	必须有你明确答复（接受 / 拒绝 / 转 FIX / 推迟）后才能改状态
不要让 AI 直接编辑老 P07 项目对齐	该文件已删除，已合并入	让 AI 改新 P07 PRD 对应章节

不要做	为什么	该怎么做
稿文件	新 P07 PRD	

第七部分 · 产物归档路径速查

产物	目录
产品发现 6 件套	docs/discovery/
项目级 PRD（合并版 P07） / 模块级 PRD / SRS / 翻新决策 / 变更说明	docs/formal-requirements/
严格审查报告 / 原型评审结论 / 交付检查报告	docs/review/
需求变更记录	docs/changes/
数据字典	docs/data/
接口对齐报告	docs/api-alignment/
流程说明	docs/flow/
测试用例	docs/testing/
用户手册 / 使用说明书	docs/manuals/
原型页面	src/views/{模块目录}/
待回写清单（持久化，跨会话）	docs/_待回写清单.md

第八部分 · 一页速查清单（可打印勾选）

【项目级启动 · 一次性】

- ☐ 0 项目总入口分流
- ☐ 1 启动输入收集
- ☐ 2 产品发现 6 件套（先选档位：默认中档；重档 / 中档 / 轻档）→ docs/discovery/
- ☐ 3 项目级 PRD · 骨架版（合并版 P07：先填对齐决策段 §9 ~ §12，再补 §1、§2、§5 ~ §8 锚点）→ docs/formal-requirements/

【模块循环 · 每个模块各一遍 · 二件套】

- ☐ 4 模块级 PRD（二件套首件，含 §需求背景 + §待确认清单；引用项目级 PRD）
- ☐ 5 模块级 SRS（二件套次件，字段/状态锁定）
- ☐ 6 流程图（简单流程可省略，直接嵌 SRS §5.x.3）
- ☐ 7 页面原型（src/views/）
- ☐ 8A 评审阶段 1 严格审查（多轮至无 P1/P2，建议每轮新会话）

- ☐ 8B 评审阶段 2 原型评审（决策表须你填写）
- ☐ 9 开发交接（5 项强制中包含数据字典；流程说明为 1 项可选）← 模块级 PM 交付终点
- ☐ ↓ 完工后回填项目级 PRD §3 模块索引、§4 依赖矩阵

【项目级封板 · 全部模块完成后一次性】

- ☐ 10 项目级 PRD · 封板版（§3/§4 补全 + 复核 §1/§5 ~ §9）

【程序员续接】

- ☐ 11 接口对齐（程序员主责）
- ☐ 12 构建验证（程序员主责）
- ☐ 13 交付检查（跨边界广度核验）
- ☐ 14 正式交付（程序员 / 项目交付负责人）

【横切流程 · 随时可能插入】

- ☐ 需求变更（CR-XXX，判断回退阶段）
- ☐ 文档生成与版本管理（补文档 / 升版本）
- ☐ 老系统翻新（阶段 4 前产出 M{n}-01 翻新决策）

【省钱习惯（每次操作前问自己）】

- ☐ 这个任务该开新会话吗？（命中第五部分 §5.2 8 项之一就开）
- ☐ 我能用 @文件名 显式引用，而不是让 AI 全仓搜吗？
- ☐ 这是个长任务，我让 AI 先列计划了吗？
- ☐ 多个小改可以攒一批一起做吗？

记忆口诀：

项目开头勘探一次（产品发现，选中档）+ 出合并版 P07 PRD 定锚；之后每个模块照着「PRD（二件套首件）→ SRS（二件套次件）→ 流程图 → 原型 → 评审两阶段 → 5 项强制开发交接」走一遍，做完顺手回填 P07 §3/§4；全部模块完工后封板 P07，再由程序员继续接口、构建与正式交付。

省钱要诀：重节点开新会话、原型小改攒入待回写清单、长任务先要计划、用 @ 引用代替全仓搜。拿不准就喊“项目总入口”。
